Nordre Strandvej - nedklassificering/nedlæggelse

Udskrevet den 4. marts 2025 13:39

POWERED BY LETSBUILD

Navn
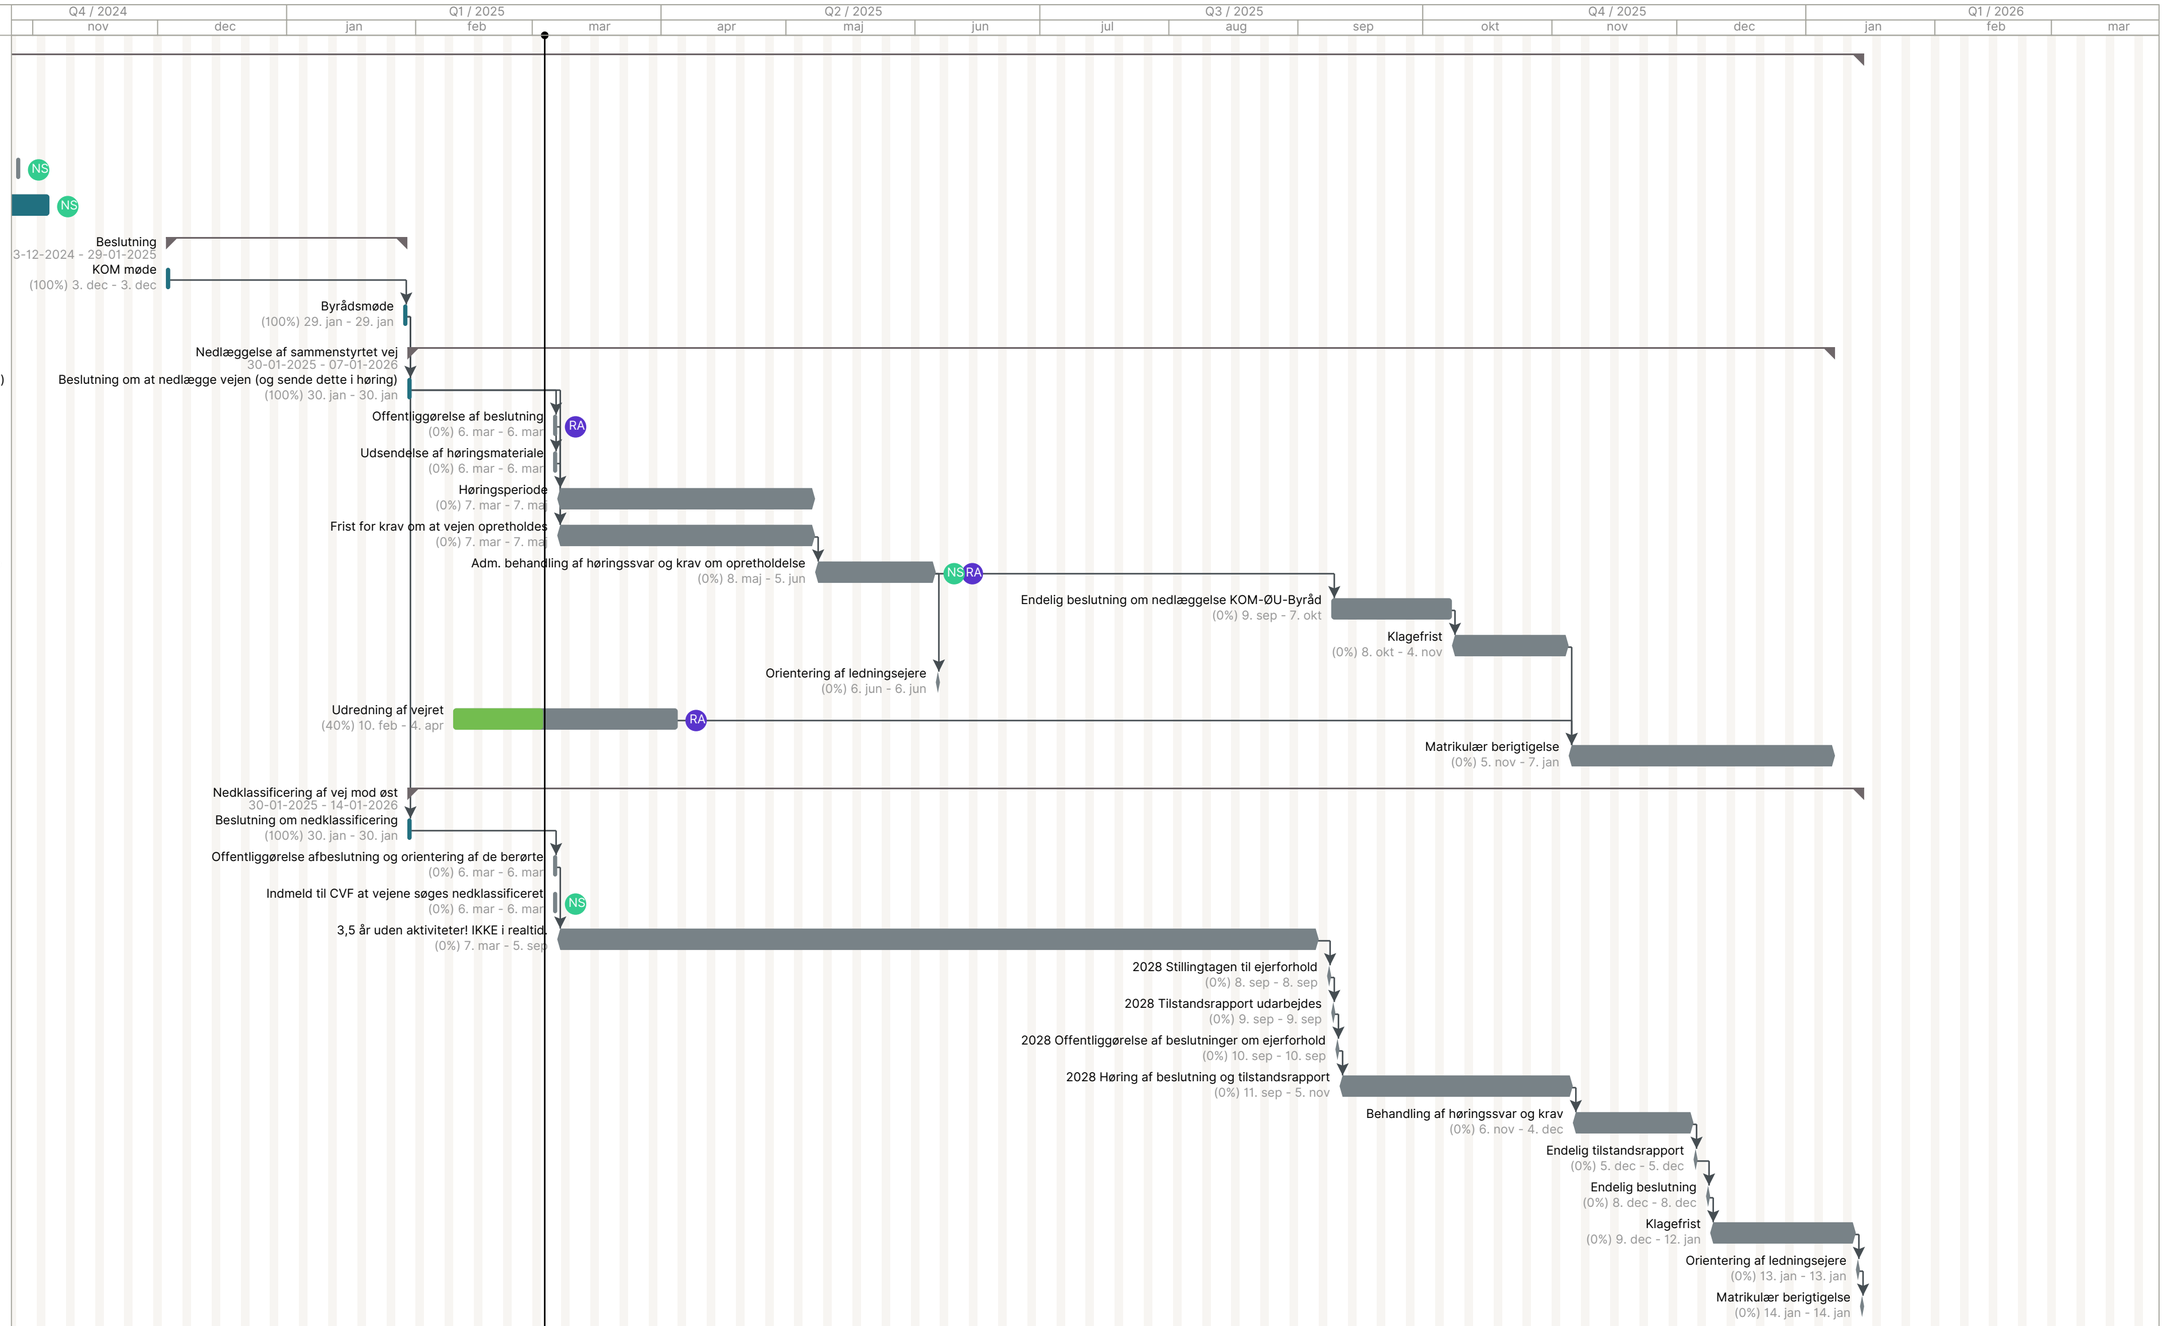
- Afklaring om proces
  03-10-2024 - 14-01-2026 (468 days)
  - Notat fra René
    3. okt - 3. okt (1 days) (80%)
  - Oprettelse af tidsplan
    3. okt - 3. okt (1 days) (90%)
  - Koordinering med myndighed
    28. okt - 28. okt (1 days) (0%)
  - Sagsfremstilling
    3. okt - 4. nov (23 days) (100%)
- Beslutning
  03-12-2024 - 29-01-2025 (57 days)
  - KOM møde
    3. dec - 3. dec (1 days) (100%)
  - Byrådsmøde
    29. jan - 29. jan (1 days) (100%)
- Nedlæggelse af sammenstyrtet vej
  30-01-2025 - 07-01-2026 (342 days)
  - Beslutning om at nedlægge vejen (og sende dette i høring)
    30. jan - 30. jan (1 days) (100%)
  - Offentliggørelse af beslutning
    6. mar - 6. mar (1 days) (0%)
  - Udsendelse af høringsmateriale
    6. mar - 6. mar (1 days) (0%)
  - Høringsperiode
    7. mar - 7. maj (41 days) (0%)
  - Frist for krav om at vejen opretholdes
    7. mar - 7. maj (41 days) (0%)
  - Adm. behandling af høringssvar og krav om opretholdelse
    8. maj - 5. jun (20 days) (0%)
  - Endelig beslutning om nedlæggelse KOM-ØU-Byråd
    9. sep - 7. okt (21 days) (0%)
  - Klagefrist
    8. okt - 4. nov (20 days) (0%)
  - Orientering af ledningsejere
    6. jun - 6. jun (1 days) (0%)
  - Udredning af vejret
    10. feb - 4. apr (40 days) (40%)
  - Matrikulær berigtigelse
    5. nov - 7. jan (41 days) (0%)
- Nedklassificering af vej mod øst
  30-01-2025 - 14-01-2026 (349 days)
  - Beslutning om nedklassificering
    30. jan - 30. jan (1 days) (100%)
  - Offentliggørelse afbeslutning og orientering af de berørte
    6. mar - 6. mar (1 days) (0%)
  - Indmeld til CVF at vejene søges nedklassificeret
    6. mar - 6. mar (1 days) (0%)
  - 3,5 år uden aktiviteter! IKKE i realtid.
    7. mar - 5. sep (116 days) (0%)
  - 2028 Stillingtagen til ejerforhold
    8. sep - 8. sep (1 days) (0%)
  - 2028 Tilstandsrapport udarbejdes
    9. sep - 9. sep (1 days) (0%)
  - 2028 Offentliggørelse af beslutninger om ejerforhold
    10. sep - 10. sep (1 days) (0%)
  - 2028 Høring af beslutning og tilstandsrapport
    11. sep - 5. nov (40 days) (0%)
  - Behandling af høringssvar og krav
    6. nov - 4. dec (21 days) (0%)
  - Endelig tilstandsrapport
    5. dec - 5. dec (1 days) (0%)
  - Endelig beslutning
    8. dec - 8. dec (1 days) (0%)
  - Klagefrist
    9. dec - 12. jan (20 days) (0%)
  - Orientering af ledningsejere
    13. jan - 13. jan (1 days) (0%)
  - Matrikulær berigtigelse
    14. jan - 14. jan (1 days) (0%)
